



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk40

- A-lohkon vesikaton puutyöt jatkuu
- C1-lohkon maanvaraisen lattian valuvalmistelut
- C2-lohkon 3 krs holvivalu
- A-lohkon IV-läpivientien valu
- B-lohkon höyrynsulun asennusta
- A-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä
- Kaukolämpörungon rakentaminen
- Kaivutyöt Sampolan edessä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- C1-lohkon maanvaraisen lattian valuvalmistelut jatkuvat
- C1-lohkon lattialämmitysputkien asennukset alkaa
- A-lohkon kattoelementtien asennus
- Kaivutyöt kirjaston edessä alkaa
- B-lohkon höyrynsulun asennus jatkuu

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 142

#### • Muita huomioitavia asioita

- Maanantaina aloitetaan kirjaston edustalla työt liikennejärjestelyillä ja jatkuu tiistaina kaivutöillä. Kaivutyöt etenee noin 6 m kerralla ja uraa täytetään kokoajan perässä. Kirjaston parkkipaikka joudutaan sulkemaan noin 7.10-14.10.2019 väliseksi ajaksi. Kirjaston asiakkaat voi pysäköidä torille siksi aikaa kun kirjaston parkkipaikka on suljettu. Kulku kirjastoon säilyy koko kaivutyön ajan. Tästä vielä erillinen suunnitelma kuvissa.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 3krs  
holvivalu  
käynnissä.  
(Viimeinen  
holvivalu)



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta




C1-lohkon maanvaraisten lattioiden  
valuvalmistelut käynnissä.





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta

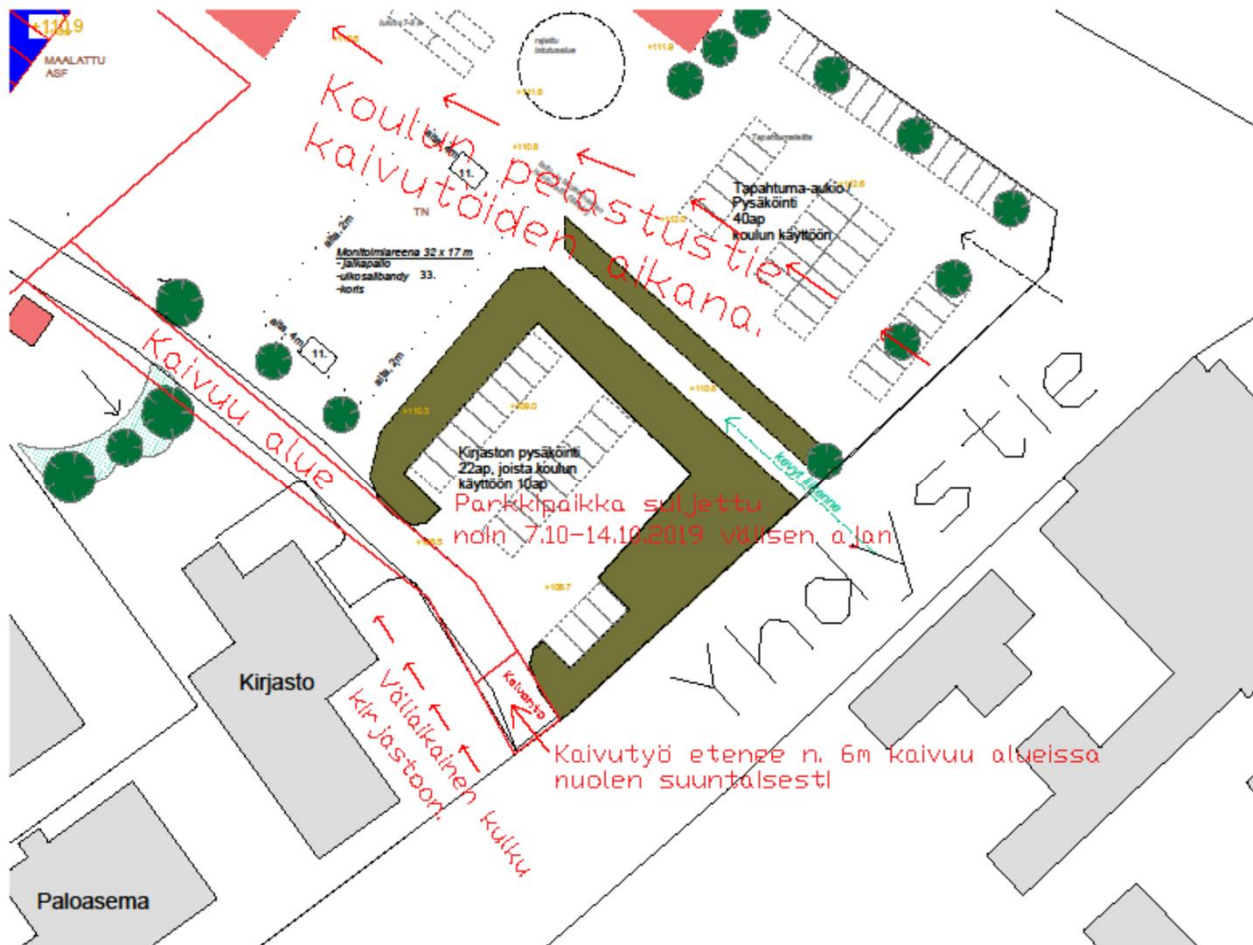

Kirjaston edustan kaivutöiden suunnitelma.

